



大切な社会資本のストックマネジメントに貢献する

国土交通省

[AT- P 工法]

NETIS 登録番号QS-060003VE

平成28年度 施工実績書

補強筋埋め込み方式PCM巻立て橋脚補強工法



AT工法研究会



明日に架ける未来への道しるべ。



ごあいさつ

昨年11月、国土交通省は緊急輸送道路で進められている橋梁の耐震化について、直轄国道と高速道路に架設されている橋梁は2017年度からの10年間ですべての耐震化を完了させる方針を決めました。当面の5年間は、政府の地震調査研究推進本部が今後30年間に震度6弱以上の地震が発生する確率が26%以上あると予測されている太平洋側の地域で対策を先行させるとのこと、少なくとも落橋や倒壊の防止を満たす対策を完了できるよう、社会資本整備総合交付金などで優先的に支援する方針となっております。

また昨年4月に発生した熊本地震では、震度7を観測する地震が4月14日と16日の2度立て続けに発生したことによる想定外の被害について、新たな対策を講じる必要が出ております。そして首都圏や関東全域では直下型地震の発生が懸念されており、国民の耐震補強への関心はさらに高まっております。

さて私共が手掛けておりますAT工法は、「河積阻害」や「建築限界」、「流量」や「内空断面」の制限を受ける構造物に対する耐震補強工法として、あらゆる方面で必要とされております。

私共、AT法研究会はこれから変化していく環境に対応すべく、研究と開発を積み重ね、皆様方のご期待に応えられる工法研究会としてさらに精進して参りますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

AT工法研究会 会長 久保田 満



Construction Results

平成28年度

施工実績

平成18年度／ 5件
平成19年度／ 17件
平成20年度／ 17件
平成21年度／ 10件
平成22年度／ 19件
平成23年度／ 18件
平成24年度／ 30件
平成25年度／ 29件
平成26年度／ 34件
平成27年度／ 30件
平成28年度／ 28件


合 計 237件



宮戸橋



笹目水門

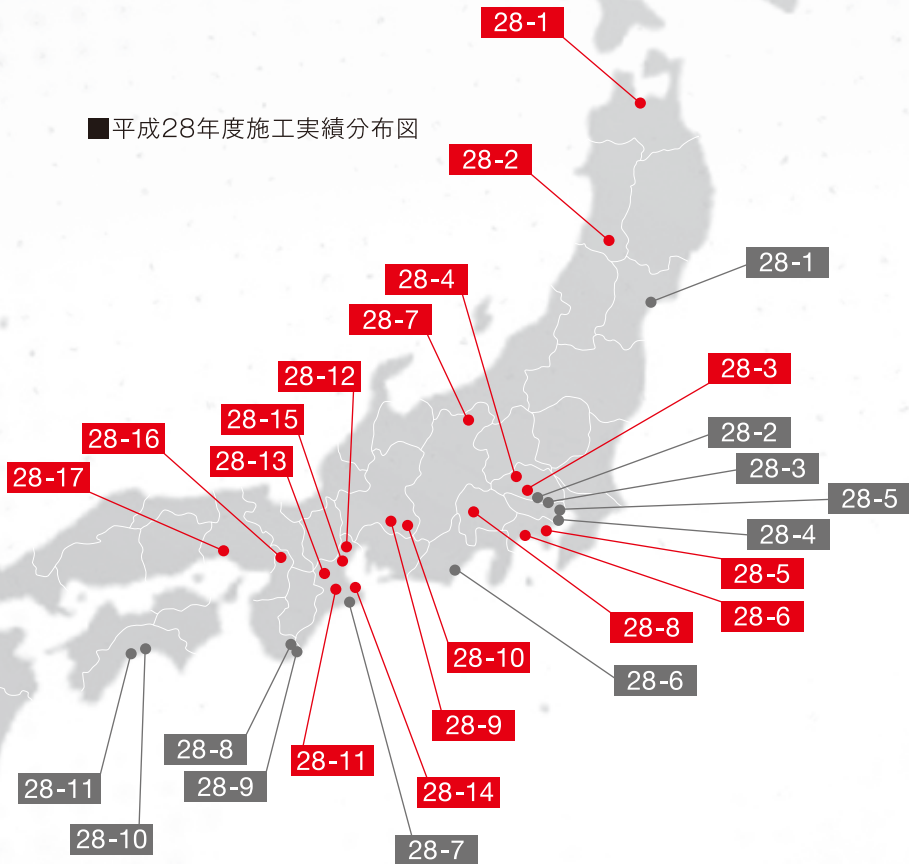

橋 梁

都道府県名	橋 梁 名 称	工 事 名	
青森県	金高橋	青森環状野内線橋梁補修(金高橋)工事	28-1
秋田県	成瀬川橋 P6	平成28年度 地方道路交付金工事(橋梁補修) FI 57-30	28-2
埼玉県	宮戸橋 P3	宮戸橋耐震補強工事(第3期)	28-3
埼玉県	柳町橋	柳町橋耐震補強工事	28-4
神奈川県	グランモール橋	グランモール橋耐震補強工事	28-5
神奈川県	神川橋 P5	平成28年 度橋りょう補修工事 公共(その2) (P5)	28-6
長野県	不動岩橋	平成28年度 防災安全交付金(修繕)橋梁補修(地方道)工事	28-7
山梨県	久那土橋 P1	主要地方道三郷身延線久那土橋耐震補強工事	28-8
岐阜県	諏訪橋 P3	平成28年度 県単橋りょう維持修繕指定修繕(一般)他工事	28-9
岐阜県	井乃口橋 P3	井乃口橋耐震補強補修(第2期)工事	28-10
三重県	桜 橋	平成28年度 一般国道368号(桜橋)橋梁耐震補強工事	28-11
三重県	三笠橋 P4 P5 P6	平成28年度 一般国道421号(三笠橋)橋梁耐震補強工事	28-12
三重県	新羽根橋	平成28年度一般国道165号(新羽根橋)橋梁耐震対策工事	28-13
三重県	幸丘橋 P1	平成28年度 一般国道167号(幸丘橋・P1橋脚)橋梁耐震補強工事	28-14
三重県	川合棕川橋	平成28年度 川合棕川橋耐震補強工事	28-15
大阪府	巡礼橋2号	平成28年度 巡礼橋2号橋梁改良工事	28-16
兵庫県	小川橋 P8 P9 P10 P11	平成28年度(国)372号小川橋補修・耐震補強工事(下部工その1)	28-17

水 門・樋 門

都道府県名	水 門・樋 門 名 称	工 事 名	
宮城県	東名水門	東名運河河川災害復旧工事(その2)	28-1
埼玉県	笹目水門	関東地方整備局 H27笹目水門耐震対策工事	28-2
埼玉県	三領水門	関東地整三領水門耐震対策工事	28-3
東京都	羽田第二水門	H27多摩川羽田第二水門耐震工事	28-4
東京都	大島川水門	大島川水門耐震補強工事(2期)	28-5
静岡県	湯日川水門	平成28年度二級河川湯日川河川改良工事(湯日川水門耐震工事)	28-6
三重県	鵜方水門	平成28年度二級河川前川(鵜方水門)耐震補強工事	28-7
和歌山県	鮎田用水樋門	平成28年度 鮎田地区輪中堤整備工事(鮎田用水樋門)	28-8
和歌山県	市田川水門	平成28年度 市田川水門及び排水機場耐震工事	28-9
高知県	甲殿水門	地震高潮第16-4号 新川川(新川川樋門外)地震高潮対策工事	28-10
高知県	中口川水門	中口川地震高潮対策工(地震高潮第18-8号)	28-11



H24年度施工 吾妻橋

橋 梁

平成28年度 橋梁工事 17件

01 金高橋

28-1

① 着工前

工 事 名	青森環状野内線橋梁補修(金高橋)工事
工事場所	青森県青森市大字高田地内 金高橋
発 注 者	青森県東青地域県民局
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=52㎡ 主筋 D19@125 帯筋 D16@150 t=34mm
施工時期	平成28年11月～平成29年1月 (AT-P工法:24日)
元請会社	株式会社澤田建設



②主鉄筋埋設溝切削



③コア削孔



④帯鉄筋固定



⑤保護被覆ネット定着



⑥完 成

施工/創青建設(株)

02 成瀬川橋

28-2

① 着工前

工 事 名	平成28年度 地方道路交付金工事(橋梁補修)FI57-30
工事場所	秋田県横手市増田字下川原地内 成瀬川橋 P6
発 注 者	秋田県平鹿地域振興局
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=81㎡ 主筋 D38@150～222.5 帯筋 D32@100 t=52mm
施工時期	平成28年12月～平成29年2月 (AT-P工法:40日)
元請会社	三又建設株式会社



②主鉄筋埋設溝切削



③コア削孔



④帯鉄筋固定



⑤保護被覆ネット定着



⑥完 成

施工/秋田振興建設(株)

03 宮戸橋

28-3



① 着工前



② 主鉄筋埋設溝切削



③ コア削孔



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆ネット定着



⑥ 完 成

施工/秋田振興建設(株)

04 柳町橋

28-4



① 着工前



② 主鉄筋埋設溝切削



③ コア削孔



④ 帯鉄筋取付



⑤ 保護被覆ネット定着



⑥ 完 成

施工/川島工業(株)

05 グランモール橋

28-5



① 着工前



② 主鉄筋埋設溝切削



③ コア削孔



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆ネット定着



⑥ 完 成

施工/第一ダイヤモンド工事(株)

06 神川橋

28-6



① 着工前



② 主鉄筋埋設溝定着



③ 帯鉄筋固定



④ 保護被覆中着



⑤ 弾性上塗完了



⑥ 完 成

施工/川島工業(株)

07 不動岩橋

28-7

AT
P工法



① 着工前

工 事 名	平成28年度 防災安全交付金(修繕)橋梁補修(地方道)工事
工事場所	長野県上高井郡高山村地内 不動岩橋
発 注 者	長野県須坂建設事務所
工 法	AT-PD工法
工事概要	N=1脚 A=107.0㎡ 主筋 D22@300 帯筋 D16@150 t=34mm
施工時期	平成29年1月～平成29年2月 (AT-PD工法:41日)
元請会社	須高建設株式会社



② 主鉄筋埋設溝切削



③ 主鉄筋定着



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/福美建設(株)

08 久那土橋

28-8

AT
P工法



① 着工前

工 事 名	主要地方道三郷身延線久那土橋耐震補強工事
工事場所	山梨県南巨摩郡身延町三澤地内 久那土橋 P1
発 注 者	山梨県峡南建設事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=54.3㎡ 主筋 D22@300 帯筋 D16@150 t=34mm
施工時期	平成28年4月～平成28年5月 (AT-P工法:21日)
元請会社	株式会社古閑工業



② 下地処理(全面ハツリ)



③ 主鉄筋埋設溝定着



④ 帯鉄筋取付



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/松村工業(株)

09 諏訪橋

28-9

AT
P工法



① 着工前

工 事 名	平成28年度県単橋りょう維持修繕指定修繕(一般)他工事
工事場所	岐阜県多治見市諏訪町神田地内 諏訪橋 P3
発 注 者	岐阜県多治見土木事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=63㎡ 主筋 D22@250 帯筋 D13@150 t=30mm
施工時期	平成28年12月～平成29年2月 (AT-P工法:34日)
元請会社	株式会社吉川組



② 下地処理(全面ハツリ)



③ 保護被覆工(下地調整)



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/(株)安部日鋼工業

10 井乃口橋

28-10

AT
P工法



① 着工前

工 事 名	井乃口橋耐震補強補修(第2期)工事
工事場所	岐阜県土岐市妻木町地内 井乃口橋 P3
発 注 者	土岐市役所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=43.6 ㎡ 主筋 D29@250 帯筋 D16@200 t=34mm
施工時期	平成29年4月～平成29年5月 (AT-P工法: 23日)
元請会社	株式会社 イトウ産業



② 主鉄筋埋設溝切削



③ 帯鉄筋固定



④ 保護被覆ネット定着



⑤ 保護被覆上塗



⑥ 完 成

施工/(株)安部日鋼工業

09

10

11 桜 橋

AT
P工法

① 着工前

工 事 名	平成28年度一般国道368号(桜橋)橋梁耐震補強工事
工事場所	三重県松阪市飯南町粥見地内 桜橋
発 注 者	三重県松阪建設事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=136.6㎡ 主筋 D16@250 帯筋 D13@150 t=30mm
施工時期	平成28年12月～平成29年2月(AT-P工法:46日)
元請会社	藤田土木株式会社



② コア削孔



③ 帯鉄筋固定



⑥ 完 成

施工/(株)安部日鋼工業



④ 保護被覆中塗



⑤ 保護被覆上塗

12 三笠橋

AT
P工法

① 着工前

工 事 名	平成28年度一般国道421号(三笠橋)橋梁耐震補強工事
工事場所	三重県いなべ市大安町高柳地内～員弁町下笠田地内 三笠橋 P4 P5 P6
発 注 者	三重県桑名建設事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=3橋脚 (P4)A=23㎡ (P5)A=23㎡ (P6)A=20㎡ 主筋 D16@250 帯筋 D16@100 t=34mm
施工時期	平成28年12月～平成29年2月 (AT-P工法:40日)
元請会社	水谷建設株式会社



② コア削孔



③ 主鉄筋埋設溝定着



⑥ 完 成

施工/(株)安部日鋼工業



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗

13 新羽根橋

AT
P工法

① 着工前

工 事 名	平成28年度一般国道165号(新羽根橋)橋梁耐震対策工事
工事場所	三重県伊賀市青山羽根地内 新羽根橋
発 注 者	三重県伊賀建設事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=28.5㎡ 主筋 D51@235 帯筋 D25@125 t=44mm
施工時期	平成28年12月～平成29年1月 (AT-P工法:33日)
元請会社	小岳建設株式会社



② 主鉄筋埋設溝定着



③ 帯鉄筋取付



⑤ 完 成

施工/(株)安部日鋼工業



④ 帯鉄筋固定

14 幸丘橋

AT
P工法

① 着工前

工 事 名	平成28年度一般国道167号(幸丘橋・P1橋脚)橋梁耐震補強工事
工事場所	三重県鳥羽市船津町地内 幸丘橋 P1
発 注 者	三重県志摩建設事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=62㎡ 主筋 D29@500 D22@500・250 帯筋 D22@100 t=41mm
施工時期	平成29年1月～平成29年2月 (AT-P工法:37日)
元請会社	株式会社大進



② 主鉄筋埋設溝切削



③ 帯鉄筋取付



⑤ 完 成

施工/(株)安部日鋼工業



④ 帯鉄筋固定


15 川合棕川橋

28-15



① 着工前

工 事 名	平成28年度川合棕川橋耐震補強工事
工事場所	三重県亀山市川合町地内 川合棕川橋
発 注 者	三重県亀山市役所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=65㎡ 主筋 D22@200 帯筋 D16@150 t=34mm
施工時期	平成29年1月～平成29年3月 (AT-P工法:47日)
元請会社	株式会社佐野組



② 主鉄筋埋設溝切削



③ 主鉄筋埋設満定着



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/(株)安部日鋼工業

17 小川橋

28-17



① 着工前

工 事 名	平成28年度(国)372号小川橋補修・耐震補強工事(下部工その1)
工事場所	兵庫県姫路市花田町小川地内 小川橋 P8 P9 P10 P11
発 注 者	兵庫県中播磨県民センター
工 法	AT-P工法
工事概要	N=4橋脚 A=401㎡ 主筋 D19@300 帯筋 D16 @150 t=34mm
施工時期	平成28年12月～平成29年3月 (AT-P工法:70日)
元請会社	家島建設株式会社



② 主鉄筋埋設溝切削



③ 主鉄筋埋設満定着



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/(株)横浜システック

16 巡礼橋 2号

28-16



① 着工前

工 事 名	H28年度 巡礼橋2号橋梁改良工事
工事場所	大阪府茨木市地内 巡礼橋2号
発 注 者	大阪府茨木市役所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1橋脚 A=38.6㎡ 主筋 D16@300 帯筋 D13@150 t=30mm
施工時期	平成29年1月～平成29年2月 (AT-P工法:31日)
元請会社	新成開発株式会社



② 埋設溝切削



③ 主鉄筋埋設満定着



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/福美建設(株)



H25年度施工 安倍川丸子川水門

水門・樋門

平成28年度 水門・樋門工事 11件

01 東名水門

28-1



① 着工前

工 事 名	東名運河河川災害復旧工事(その2)
工事場所	宮城県東松島市野蒜地内 東名水門
発 注 者	宮城県北部土木事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	端部堰柱・門柱/中央堰柱・門柱/N=1基 A=303.7㎡ 配力筋 D25・D29・D32 @150・300 t=72~88mm
施工時期	平成28年4月~平成28年8月 (AT-P工法:105日)
元請会社	竹中土木株式会社



② 下地処理(全面ハツリ)



③ コア削孔



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆ネット定着



⑥ 完 成

施工/(株)YAP

02 笹目水門

28-2



① 着工前

工 事 名	H27笹目水門耐震対策工事
工事場所	埼玉県戸田市早瀬一丁目 地内 笹目水門
発 注 者	関東地方整備局 荒川下流河川事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	端部門柱 N=2 門柱A=98㎡ 中央門柱N=1門柱A=68㎡ 帯筋 D13 D16@300 D25 D32@150 t=16mm
施工時期	平成28年3月~平成28年9月 (AT-P工法:130日)
元請会社	岩倉建設株式会社



② 埋設溝切削



③ 帯鉄筋取付



④ 埋設溝定着



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/秋田振興建設(株)

03 三領水門

28-3



① 着工前



② 埋設溝切削



③ コア削孔



⑥ 完 成

施工/大熊工業(株)

工 事 名	関東地整三領水門耐震対策工事
工事場所	埼玉県川口市宮町地先 三領水門
発 注 者	関東地方整備局 荒川下流河川事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=3門柱(上流・下流端部門柱 中央門柱) A=358㎡(3門柱合計) 補強筋 D19 D32 D38 (上流・下流端部門柱) @125~@200 t=16mm 補強筋 D16 D19 (中央門柱) @125~@200 t=16mm
施工時期	平成28年1月~平成29年3月(AT-P工法:200日)
元請会社	戸田建設株式会社

05 大島川水門

28-5



① 着工前



② 埋設溝切削



③ 帯鉄筋取付



④ 帯鉄筋定着



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/川島工業(株)

工 事 名	大島川水門耐震補強工事(2期)
工事場所	東京都江東区永代一丁目 地内 大島川水門
発 注 者	東京都江東治水事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=2門柱(右岸門柱・中央門柱) A=22.4㎡(埋設溝部施工) 帯筋 D16@400 t=15mm
施工時期	平成28年8月~平成28年9月(AT-P工法:60日)
元請会社	日東河川工業株式会社

04 羽田第二水門

28-4



① 着工前



② 保護被覆中塗(吹付1層目)



③ 保護被覆中塗(吹付2層目)



④ 保護被覆上塗



⑤ 弾性仕上材



⑥ 完 成

施工/大熊工業(株)

工 事 名	H27多摩川羽田第二水門耐震工事
工事場所	東京都大田区 羽田第二水門地先 羽田第二水門
発 注 者	関東地方整備局 京浜河川事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=2門柱 A=140㎡ 帯筋 D16@250 t=57mm
施工時期	平成28年3月~平成28年8月(AT-P工法:30日)
元請会社	北野建設株式会社

06 湯日川水門

28-6



① 着工前



② コア削孔



③ 主鉄筋埋設溝定着



④ 帯鉄筋取付



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/中村建設(株)

工 事 名	平成28年度二級河川湯日川河川改良工事(湯日川水門耐震工事)(堰柱部その4)湯日川水門
工事場所	静岡県榛原郡吉田町住吉地先 湯日川水門
発 注 者	静岡県島田土木事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=中央堰柱右岸下流側 A=18㎡ 主筋 D16@250 帯筋 D13@250 t=30mm
施工時期	平成28年4月~平成28年5月(AT-P工法:20日)
元請会社	大石建設株式会社

07 鵜方水門

28-7

AT-PN工法

① 着工前



工 事 名	平成28年度二級河川前川(鵜方水門)耐震補強工事
工事場所	三重県志摩市阿児町鵜方地内 鵜方水門
発 注 者	三重県志摩建設事務所
工 法	AT-PN工法
工事概要	左岸堰柱 A=31.4㎡ 中央堰柱(左岸側) A=33.6㎡ (左岸堰柱)主筋 D29@150 帯筋 D13@300 t=60mm (中央堰柱)主筋 D13@250 帯筋 D13@300 t=50mm
施工時期	平成29年1月～平成29年3月 (AT-PN工法:53日)
元請会社	丸文工業株式会社



② 下地調整



③ コア削孔



⑥ 完 成

施工/(株)安部日鋼工業



④ 主鉄筋固定



⑤ 帯鉄筋固定

08 鮎田用水樋門

28-8

AT-P工法

① 着工前



工 事 名	平成28年度 鮎田地区輪中堤整備工事
工事場所	和歌山県新宮市地内 鮎田用水樋門
発 注 者	近畿地方整備局 紀南河川国道事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1函体(底版) A=6㎡ 主筋 D32@100 帯筋 D16 @125 t=34mm
施工時期	平成28年12月～平成29年1月 (AT-P工法:12日)
元請会社	株式会社山口建設



② 主鉄筋埋設溝切削



③ 主鉄筋埋設溝定着



⑥ 完 成

施工/(株)横浜システック



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗

09 市田川水門

28-9

AT-P工法

① 着工前



工 事 名	H28年度 市田川水門及び排水機場耐震補強工事
工事場所	和歌山県新宮市地内 市田川水門
発 注 者	近畿地方整備局 紀南河川国道事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=中央堰柱、右岸堰柱 A=157㎡ 主筋 D22@250 帯筋 D13@300 t=30mm
施工時期	平成29年1月～平成29年3月 (AT-P工法:60日)
元請会社	株式会社畑中産業



② 主鉄筋埋設溝切削



③ 主鉄筋埋設溝定着



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/(株)横浜システック

10 甲殿水門

28-10

AT-P工法

① 着工前




工 事 名	地震高潮第16-4号 新川川(新川川樋門外)地震高潮対策工事
工事場所	高知県高知市春野町甲殿地内 甲殿水門
発 注 者	高知県高知土木事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=4流路底版 A=102㎡ 主筋 D19@250 帯筋 D16@250 t=34mm
施工時期	平成28年5月～平成28年7月 (AT-P工法:45日)
元請会社	高大建設株式会社



② 下地処理(全面ハツリ)



③ 主鉄筋埋設溝定着



④ 保護被覆中塗



⑤ 表面仕上ATライニング材



⑥ 完 成

施工/誠建設有限会社

11 中口川水門

28-11



② 下地処理(バキュームブラスト)



③ 主鉄筋埋設溝定着



④ 帯鉄筋固定



⑤ 保護被覆中塗



⑥ 完 成

施工/誠建設有限公司

工 事 名	中口川地震高潮対策工(地震高潮第18-8号)
工事場所	高知県土佐市宇佐町地内 中口川水門
発 注 者	高知県中央西土木事務所
工 法	AT-P工法
工事概要	N=1門柱 A=29㎡ 主筋 D19@250 帯筋 D13@150 t=30mm
施工時期	平成28年5月～平成28年6月 (AT-P工法: 21日)
元請会社	有限会社愛機工業

A T 工法研究会会員

会 社 名	住 所	担 当 者 名	T E L
みぞぐち事業 株式会社	北海道函館市西桔梗町589番地44	佐々木 義勝	0138-48-0810
みぞぐち事業 株式会社 札幌支店	北海道札幌市東区北47条東15丁目6番1号	山谷 広樹	011-790-6650
創青建設 株式会社	青森県青森市大字新城字福田269-1	秋元 勝敏	017-788-3128
東北カッター 株式会社	青森県青森市安田字若松60	岩淵 誠剛	017-766-9230
株式会社 アイケン	岩手県大船渡市末崎町字神坂77-1	山崎 年雄	0192-29-2690
株式会社 大久保建設	岩手県花巻市東和町安俣2-11番地	佐藤 政道	0198-42-4000
秋田振興建設 株式会社	秋田県大仙市大曲西根字嶋村60	小原 元正	0187-68-3111
東北カッター 株式会社 秋田営業所	秋田県秋田市金足大清水字大清水台110	佐々木 幸一	018-873-6411
創和建设 株式会社	秋田県横手市駅前町13-8	新山 嘉孝	0182-32-2680
有限会社 細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川11番地	細井 光亨	0187-84-0596
株式会社 岡田水道施設	秋田県湯沢市前森四丁目2番36号	小原 繁	0183-73-2810
株式会社 YAP	宮城県仙台市若林区卸町5丁目1-7	木皿 和浩	022-290-0890
東北カッター 株式会社 仙台営業所	宮城県多賀城市名月1-9-54	畠山 匡功	022-362-7157
寿建設 株式会社	福島県福島市飯坂町平野字東地藏田8-1	森崎 達之助	024-543-0511
株式会社 ジェビニ	新潟県新発田市佐々木2527-1	新野 光則	0254-27-6040
株式会社 大熊工業	新潟県十日町市中条丙1084-1	大熊 芳彦	025-752-3206
株式会社 大熊工業 さいたま営業所	埼玉県大宮市本郷町1294番地3号	野上 嘉幸	048-667-4558
川島工業 株式会社	東京都新宿区新宿7-27-16第二清水ビル404	佐々木 康哲	03-5155-8537
第一ダイヤモンド工事 株式会社	東京都世田谷区瀬田2-23-7	田中 芳宜	03-3700-6636
東洋機械 株式会社	東京都渋谷区東2丁目24-5渋谷東ビル5F	今井 宏太	03-5468-8008
東洋機械 株式会社 機材センター	埼玉県川口市江戸1丁目15-34	今井 宏太	048-281-3228
大進産業 株式会社	栃木県宇都宮市大曾2丁目2番42号	山本 崇史	028-627-0868
福美建設 株式会社 本社	長野県駒ヶ根市中沢4894番地1	久保田 満	0265-87-2211
福美建設 株式会社 松本事務所	長野県松本市笹賀8041-2	竹内 祥一	0263-28-6777
福美建設 株式会社 静岡事務所	静岡県静岡市駿河区西島341-1	牧野 能男	054-201-9622
中村建設 株式会社	静岡県浜松市中区中沢町71-23	金田 学	053-471-3421
株式会社 横浜システック 静岡営業所	静岡市葵区弥勒1-3-12	菅 一仁	054-266-5690
株式会社 エイ・エス・ケイ	大阪府門真市岸和田3丁目46-15	秋田 光之	072-842-5757
株式会社 安部日鋼工業 中部支店	岐阜県岐阜市六条大溝3丁目13-3	後藤 威	058-271-2642
株式会社 松原組	広島県福山市引野5218	則宗 隆之	084-941-7031
誠建設 有限会社	徳島県小松島市金磯町8-79	中野 寿之	0885-32-2759
株式会社 岸本組	佐賀県唐津市竹木場5206-82	森 啓二	0955-79-5555
株式会社 長濱興業	熊本県天草郡苓北町坂瀬川1793	長濱 優二	0969-37-0901
株式会社 川浪組	大分県日田市大字友田3725	野村 勲	0973-22-6145
株式会社 佐々木建設	大分県佐伯市宇目大字小野市4985-2	日野 一成	0972-54-3314
株式会社 アーテック	大分県日田市亀山町5-11	彌永 穂高	0973-23-9083
